


WYNIKI POMIARÓW PĘCZNIENIA SWOBODNEGO GRUNTU

miejsowość: Zielona Góra - Amfiteatr

otwór: 7

głębokość: 1,20 m p.p.t.

data i czas odczytu	odczyt	zmiana wysokości próbki [mm]	wysokość próbki [mm]	% pęcznienia
20:00	3,890	0,000	20,000	
20:05	3,950	0,060	20,060	0,30
9:00	5,765	1,875	21,875	9,38
15:00	6,260	2,370	22,370	11,85
12:00	6,995	3,105	23,105	15,53
9:00	7,045	3,155	23,155	15,78
9:00	7,048	3,158	23,158	15,79

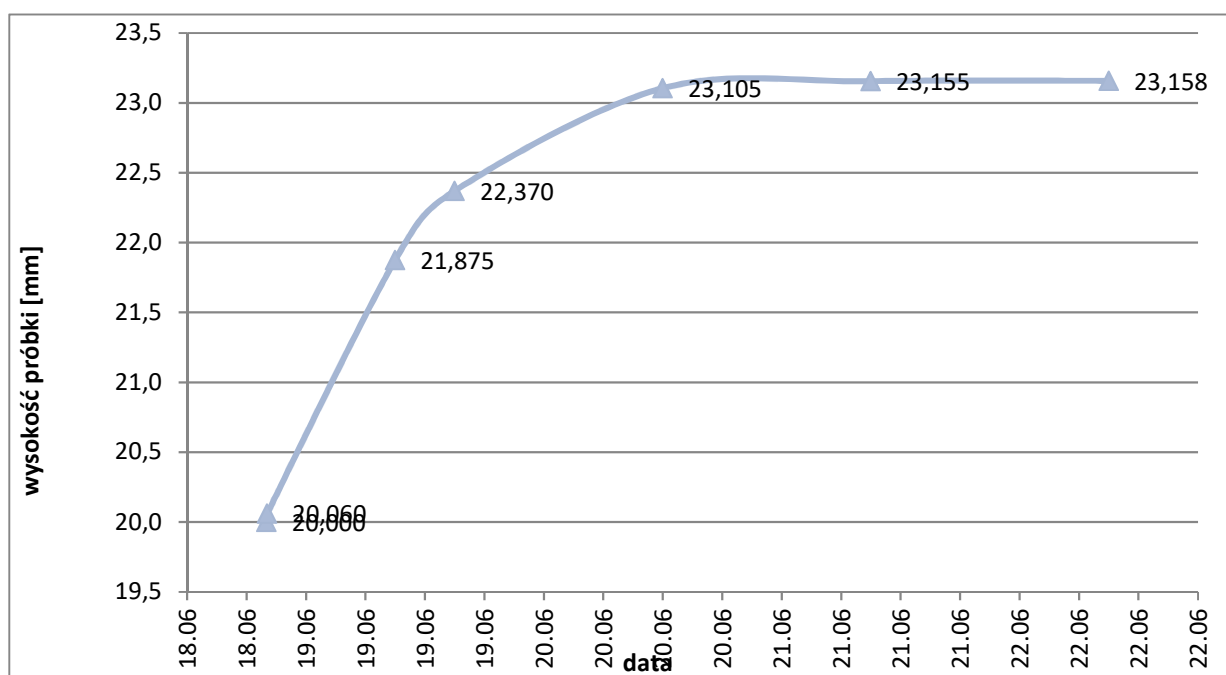


wskaźnik pęcznienia swobodnego: **15,79 %**

skurcz objętościowy: **16,71 %**

Badanie pęcznienia wykonano wg Instrukcji ITB 296

Skurcz objętościowy oznacza ubytek objętości po wysuszeniu do stanu powietrznosuchego.



wykonujący badanie: dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

upr. geol. V-1532, VII-1451
